


Fase 1: Etablering av ny kai med bakareal.
Oppstart i henhold til gitte tillatelser
Antatt byggetid: 6-8 mnd

Fase 2: Utdypning mht seiling ddybde
Offentlige godkjenninger 3-4 mnd
Antatt byggetid: 3-4 mnd


Ferdigstillelse
av fase 1 og 2
estimert til 12
mnd

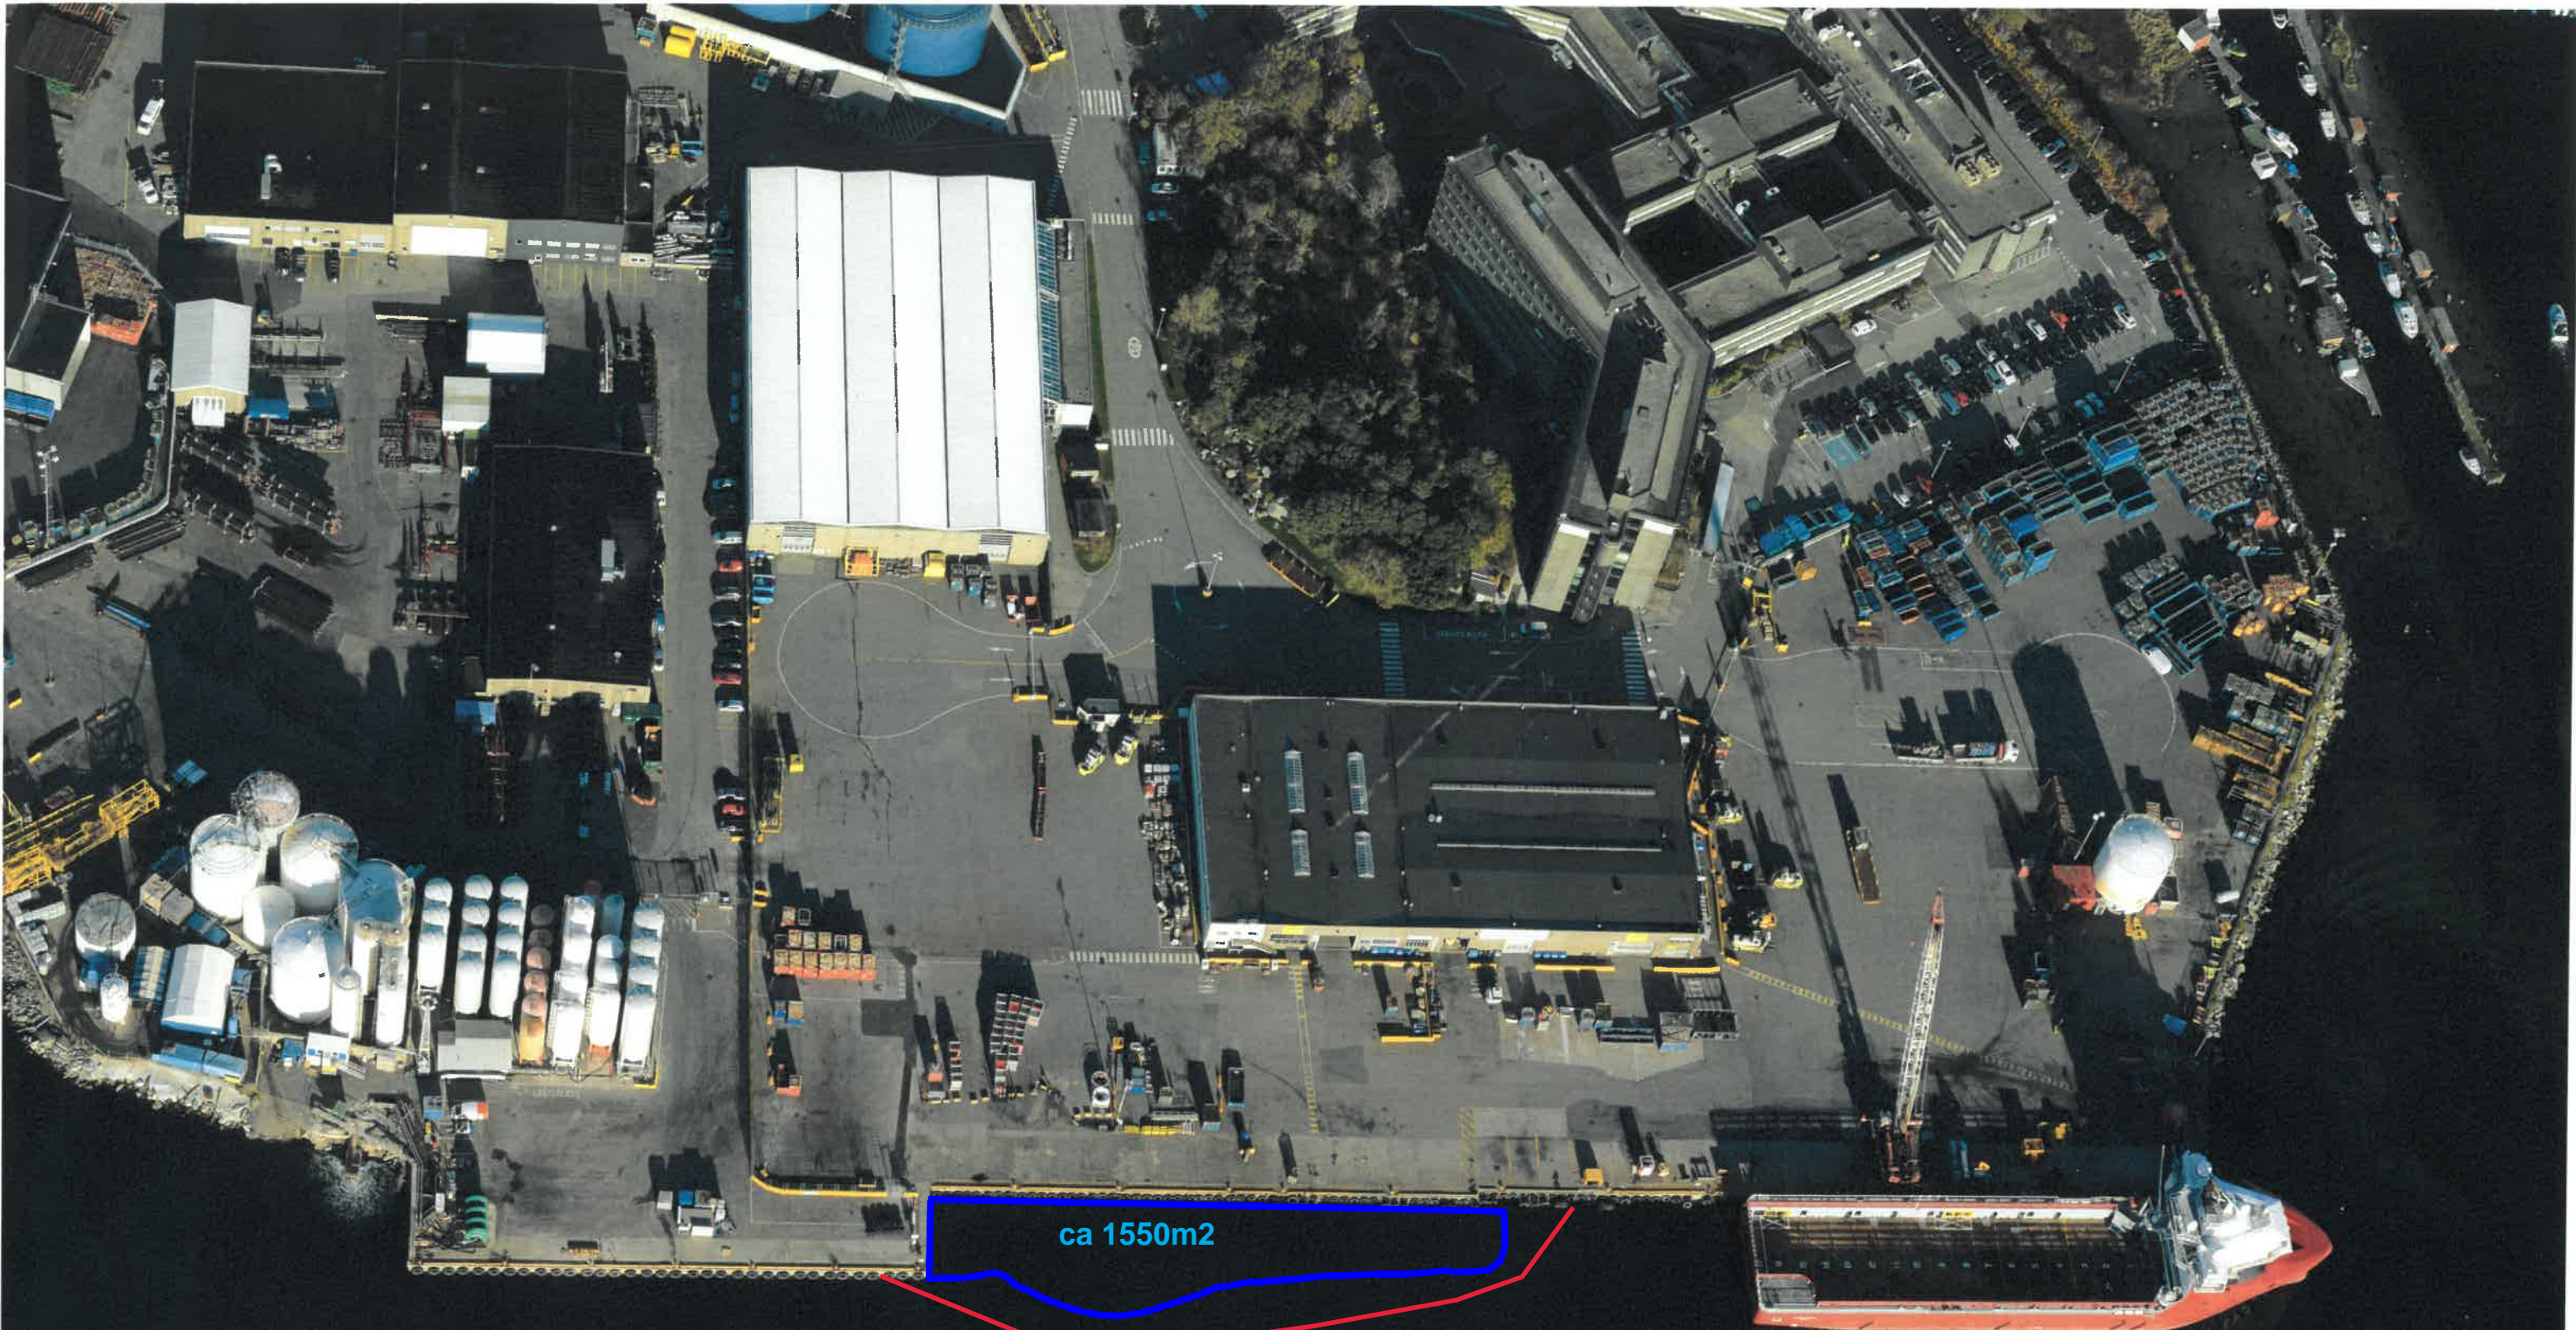

ca 1550m²

Siltgardin

1. Siltgardin etableres rundt hele området.
2. Turbiditetsmålinger utføres.
3. Øverste laget med forurensing mudres/graves og føres til land, så transporteres det til godkjent deponi. ca 3-450 m³
3. Resterende rene masser føres også til, land, de transporteres til godkjent tipp, eller igjenbrukes. ca 4000m³

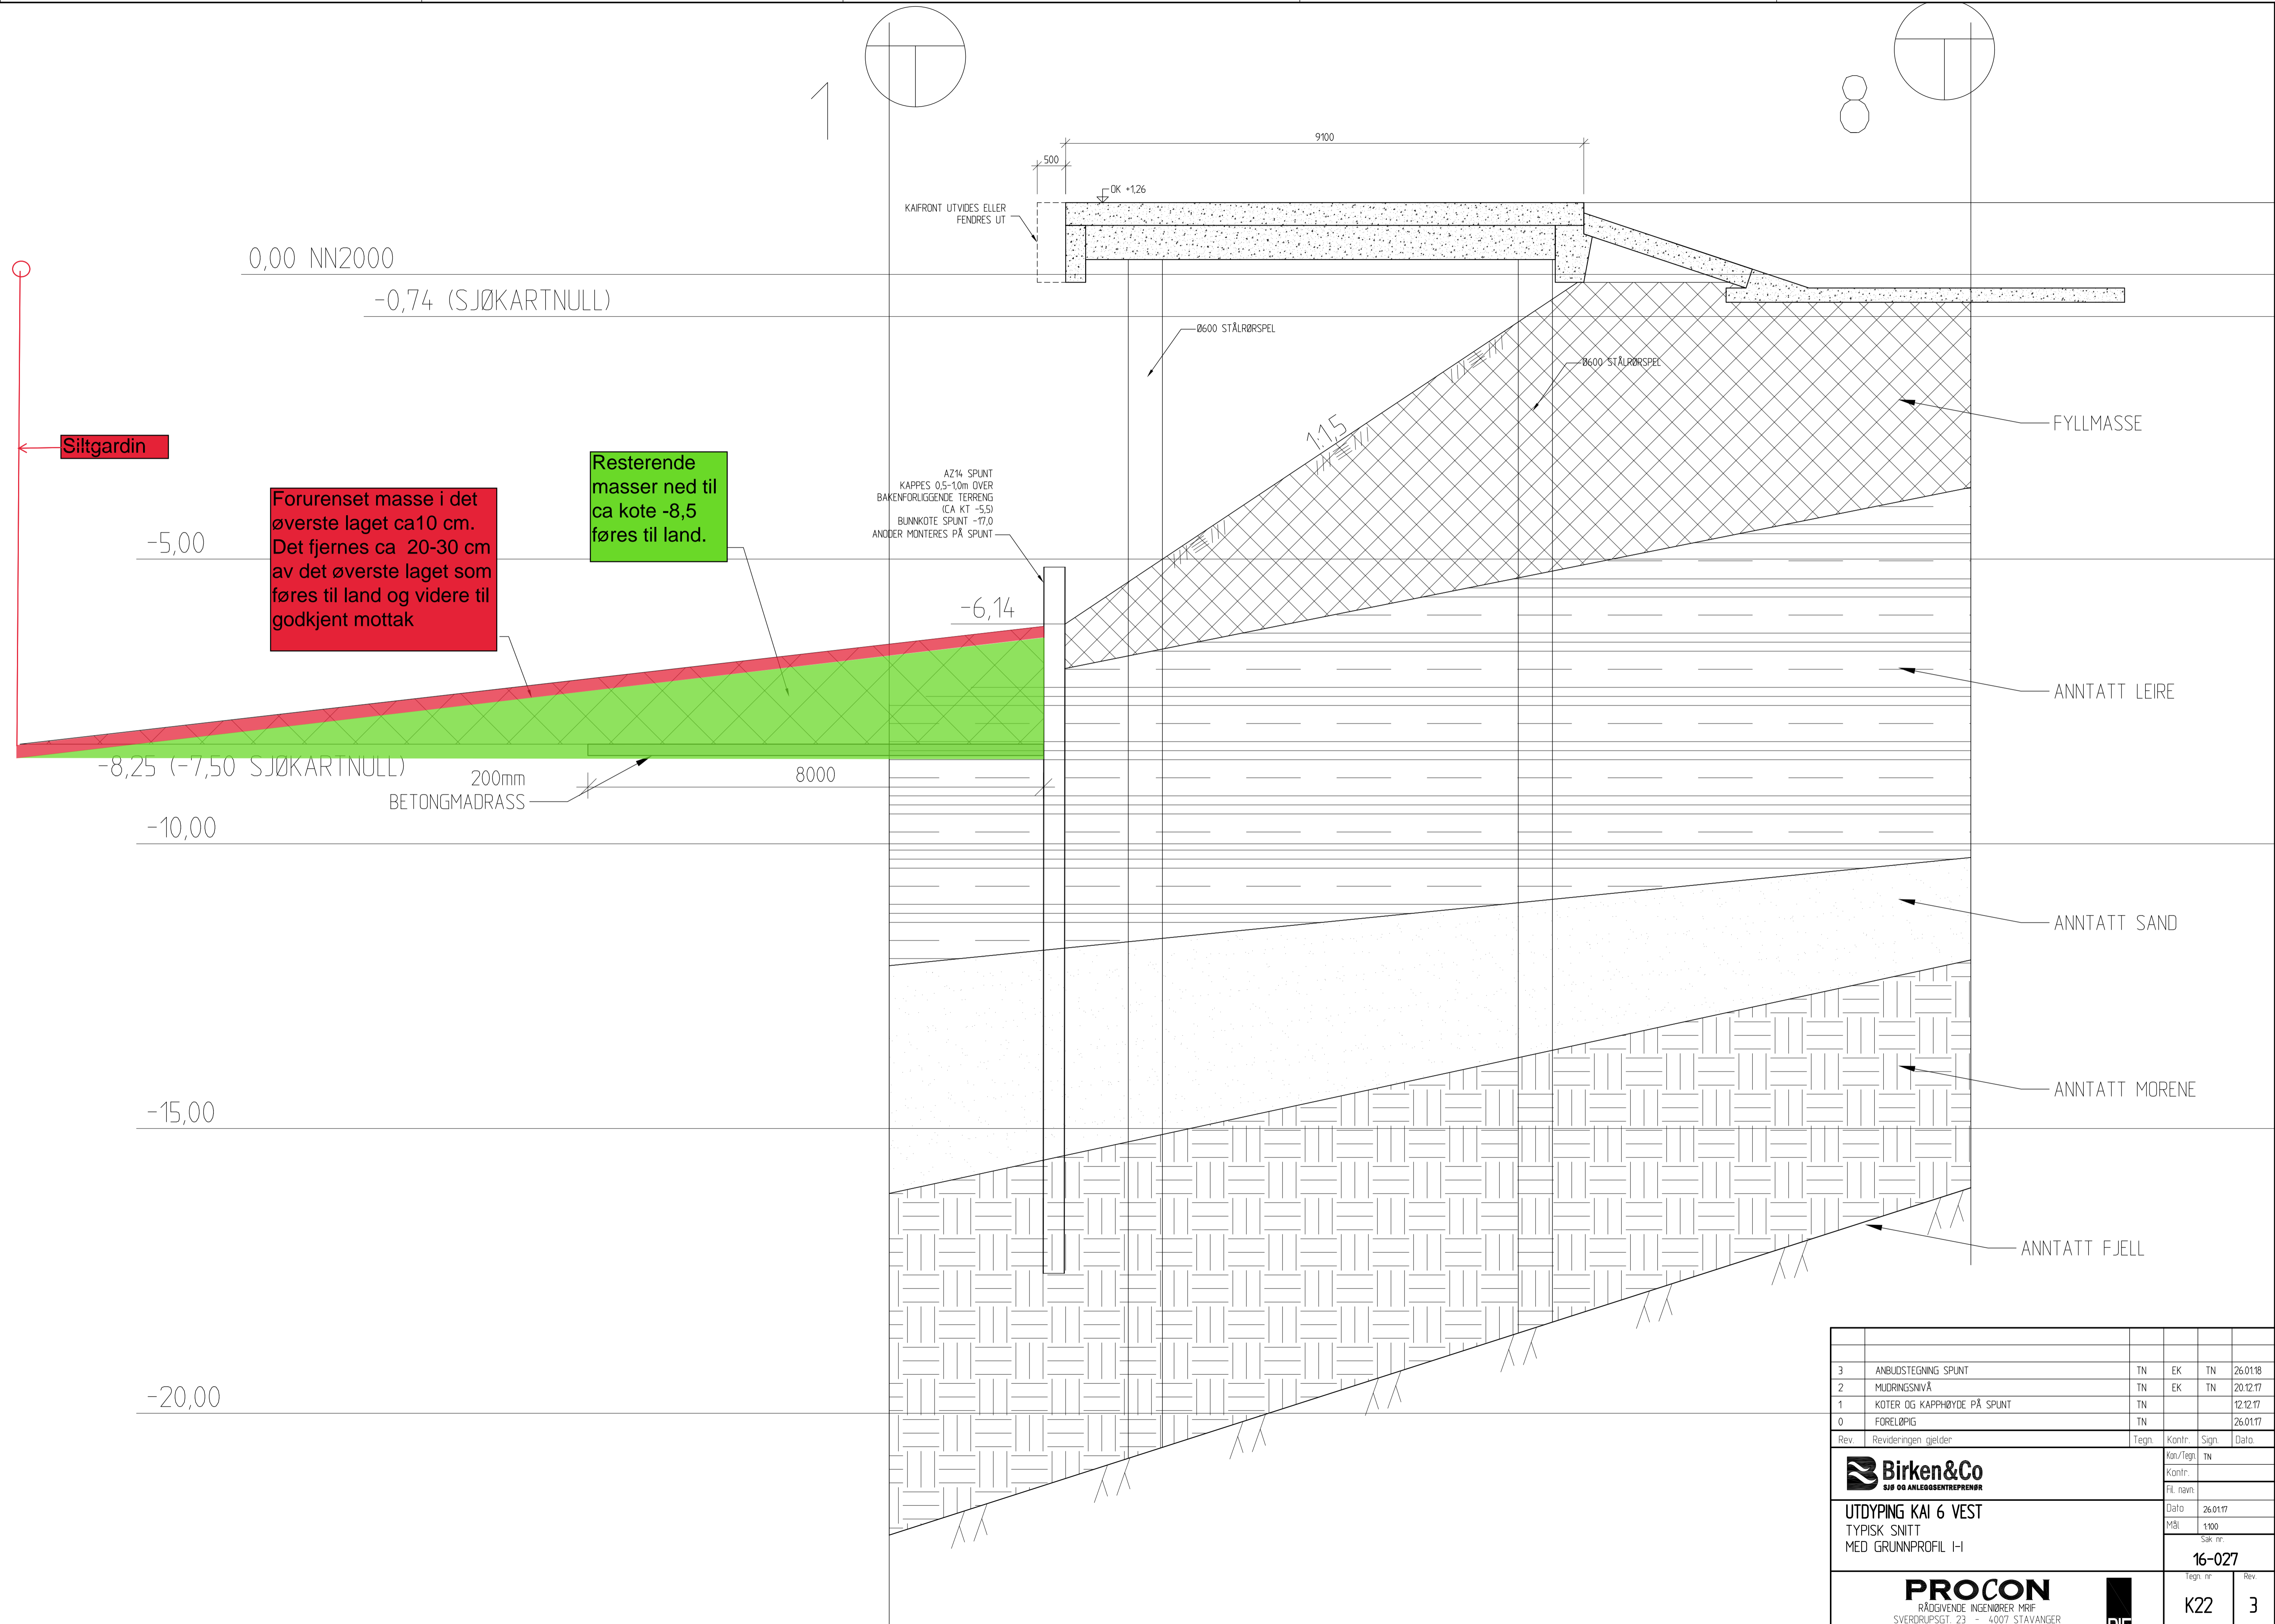

Siltgardin

Forurenset masse i det øverste laget ca 10 cm. Det fjernes ca 20-30 cm av det øverste laget som føres til land og videre til godkjent mottak

Resterende masser ned til ca kote -8,5 føres til land.

AZ14 SPUNT
KAPPES 0,5-1,0m OVER
BAKENFØRLIGGENDE TERRENG
(CA KT -5,5)
BUNNKOTE SPUNT -17,0
ANDER MONTERES PÅ SPUNT

KAI FRONT UTVIDES ELLER FENDRES UT

500

9100

OK +1,26

Ø600 STÅLRØRSPEL

Ø600 STÅLRØRSPEL

FYLLMASSE

ANNTATT LEIRE

ANNTATT SAND

ANNTATT MORENE

ANNTATT FJELL

3	ANBUSTEGNING SPUNT	TN	EK	TN	26.01.18
2	MUDRINGSNIVÅ	TN	EK	TN	20.12.17
1	KOTER OG KAPPHØYDE PÅ SPUNT	TN			12.12.17
0	FORELØPIG	TN			26.01.17
Rev.	Revideringen gjelder	Tegn.	Kontr.	Sign.	Dato.
				Kon/Tegn TN	
				Kontr.	
				Fil navn	
UTDYPING KAI 6 VEST TYPISK SNITT MED GRUNNPROFIL I-I				Dato 26.01.17	
				Mål 1:100	
				Sak nr. 16-027	
				Tegn. nr. Rev.	
RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF SVERDRUPSGT. 23 - 4007 STAVANGER TEL. 51 56 90 90 - FAX 51 56 90 91				K22 3	
